


Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego — realizacja zadań drogowych

TORUŃ 17.04.2019 R

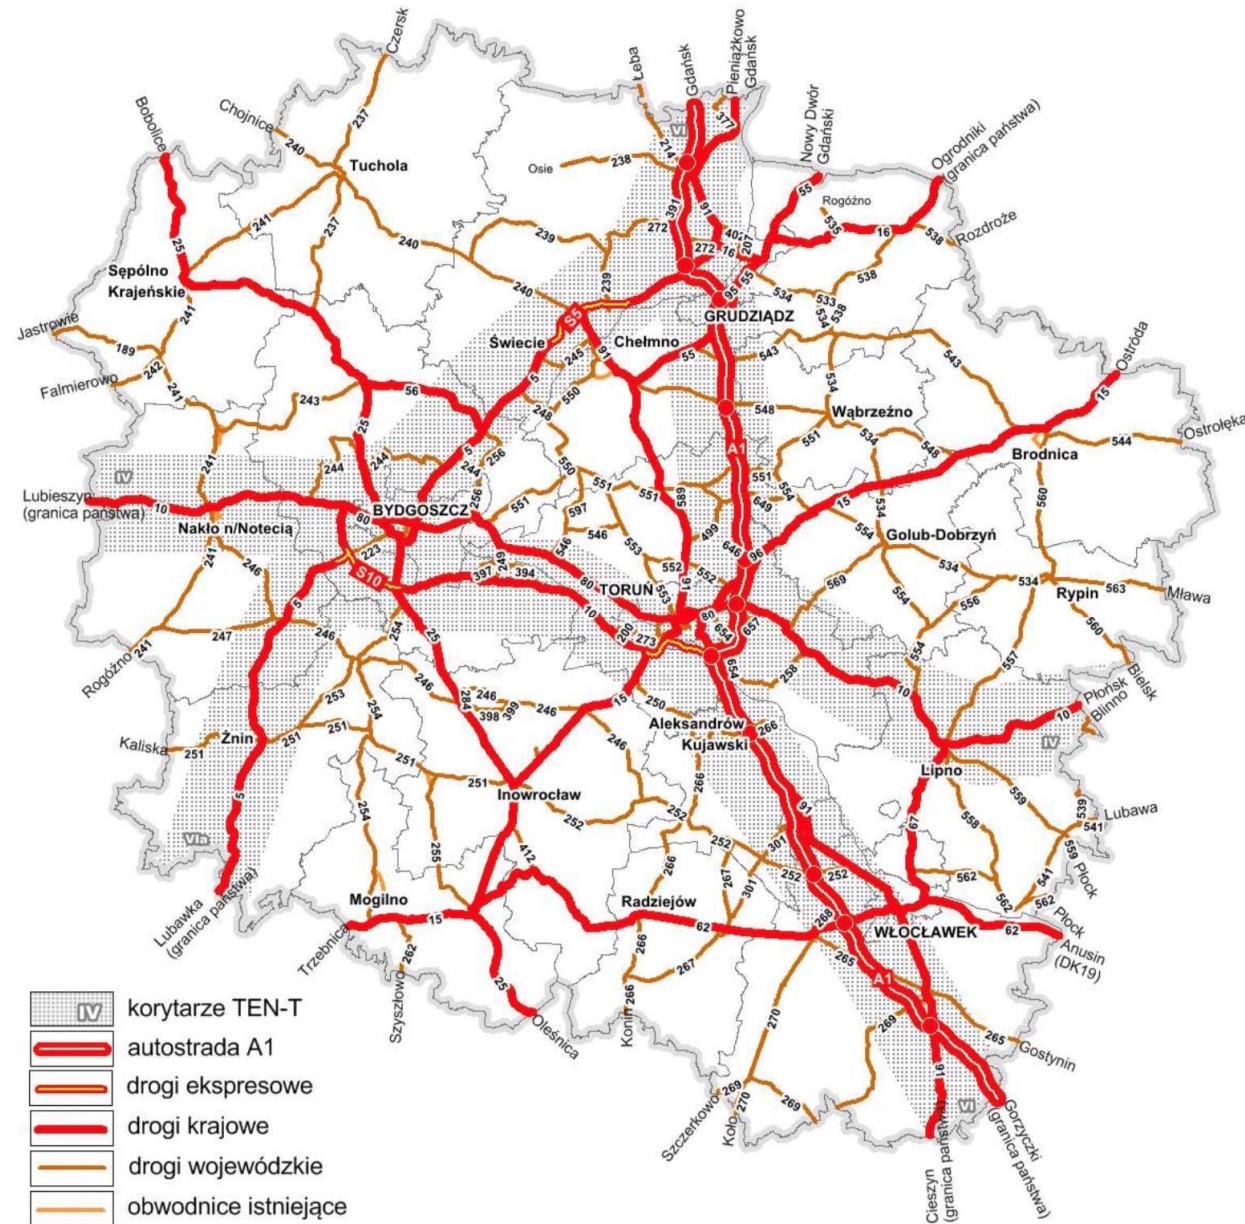

Rys.10. Sieć drogowa województwa


Źródło: Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku

Tab.9. Wykaz projektów zrealizowanych w ramach RPO WK-P 2007-2013

L.p.	Nr drogi, skrócony opis zadania	Lata realizacji	Długość odcinka [km]	Wartość [zł]
1	DW 246 Nakło – Szubin	2007 – 2008	14,400	20 548 326
2	DW 246 Szubin – Łabiszyn	2007 – 2009	13,907	21 456 366
3	DW 251 Kaliska – Inowrocław, DW 252 Inowrocław – Włocławek	2008 – 2012	62,680	107 954 076
4	DW 247 Kcynia - Szubin	2008 – 2010	15,322	34 985 185
5	DW 553 Toruń - Wybcz	2008 – 2009	14,638	23 678 345
6	DW 241 Sępólno – Kcynia	2008 – 2011	23,096	65 231 901
7	DW 534 Grudziądz – Radomin	2008 – 2010	48,437	99 459 441
8	DW 560 Brodnica – Sierpc	2009 – 2011	32,611	48 612 667
9	DW 534 Radomin – Rypin	2010 – 2011	15,055	21 756 727
10	Zakup systemu monitoringu dróg	2012	n.d.	2 155 312

11	Drogowa Inicjatywa Samorządowa 2011/12	2011 – 2012	n.d.	4 133 459
12	DW 223 m. Białe Błota	2012	0,223	1 171 417
13	DW 239 m. Gródek	2012 – 2013	1,673	4 152 408
14	241 – most na rz. Orla	2013	n.d.	2 710 877
15	Drogowa Inicjatywa Samorządowa 2013	2013	n.d.	3 255 921
16	Przebudowa ciągów dróg wojewódzkich	2014 – 2015	8,458	11 879 180
17	Budowa rond w ciągach dróg wojewódzkich	2014 – 2015	0,540	8 904 400
18	Drogowa Inicjatywa Samorządowa 2014	2014	n.d.	7 171 631
19	Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich	2014 – 2015	0,556	8 379 920
20	DW 558 m. Wielgie	2014 – 2015	1,519	4 462 960
21	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich	2014	0,391	3 534 211
22	System ewidencji i zarządzania	2011 – 2015	n.d.	10 107 496
23	Przebudowa DW 550 m. Chełmno, ul. Toruńska	2015	2,351	4 297 100
24	Przebudowa DW 251 na terenie gminy Barcin	2015	5,000	8 058 620
25	Przebudowa DW 249 m. Solec Kujawski	2015	0,320	1 700 000
26	Przebudowa DW 551 m. Unisław	2015	1,824	3 400 000
Razem			263,001	533 157 946

Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

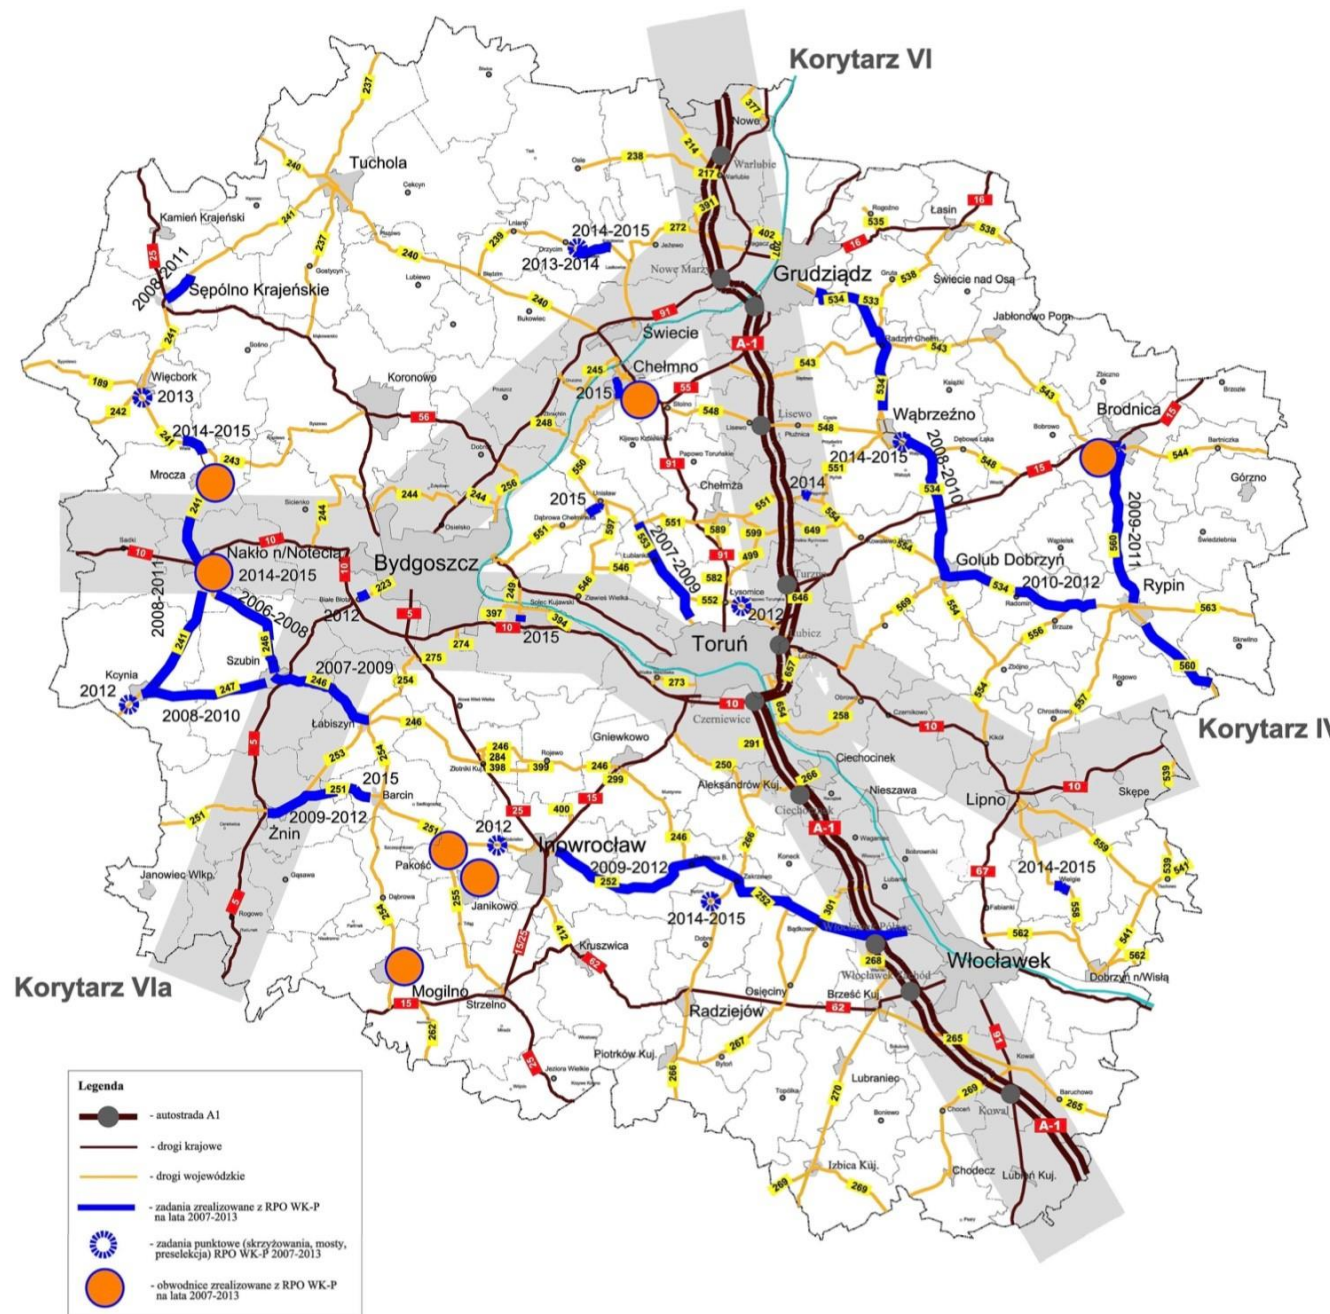


Rys.11. Rozmieszczenie projektów zrealizowanych w ramach RPO WK-P 2007-2013

Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Załącznik do uchwały Nr 52/2400/17
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28 grudnia 2017 r.



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE



KUJAWSKO-POMORSKI PLAN SPÓJNOŚCI

KOMUNIKACJI
DROGOWEJ I KOLEJOWEJ

2014-2020

KUJAWY
POMORZE

Tab.22. Wykaz przedsięwzięć drogowych przewidzianych do realizacji w latach 2014-2023


Lp.	Lokalizacja				Charakter zadania	Szacunkowy koszt zadania [mln zł]	Planowany okres realizacji
	Numer drogi	Pikietaż		Długość [km]			
		Początkowy	Końcowy				
Grupa – 1 w ramach RPO WK-P							
1.1.	548	0,005 15,146	14,144 29,619	28,612	Zgodnie z załączonymi fiskalami	100,0	2016-2023
1.2.	240	23,190 62,877	36,817 65,718	16,468		25,0	
1.3.	266	0,000	57,509	57,509		50,0	
1.4.	254	0,069	22,400	22,331		50,0	
1.5.	251	19,649 34,590	34,200 35,290	15,251		35,0	
1.6.	559	1,500	23,600	22,100		40,0	
1.7.	254	22,400	53,814	31,414		45,0	
1.8.	265	0,003	19,117	19,114		32,0	
1.9.	534	76,705	81,719	5,014		10,0	
1.10.	270	0,000	29,023	29,023		50,0	
1.11.	269	12,170 33,622	28,898 59,194	42,300		60,0	
1.12.	255	0,005	21,910	21,905		30,0	
1.13.	563	2,475	16,656	14,181		25,0	
1.14.	241	0,005	26,360	26,355		45,0	
Razem grupa 1				351,577	597,0		



Korytarz VI



KUJAWY
POMORZE

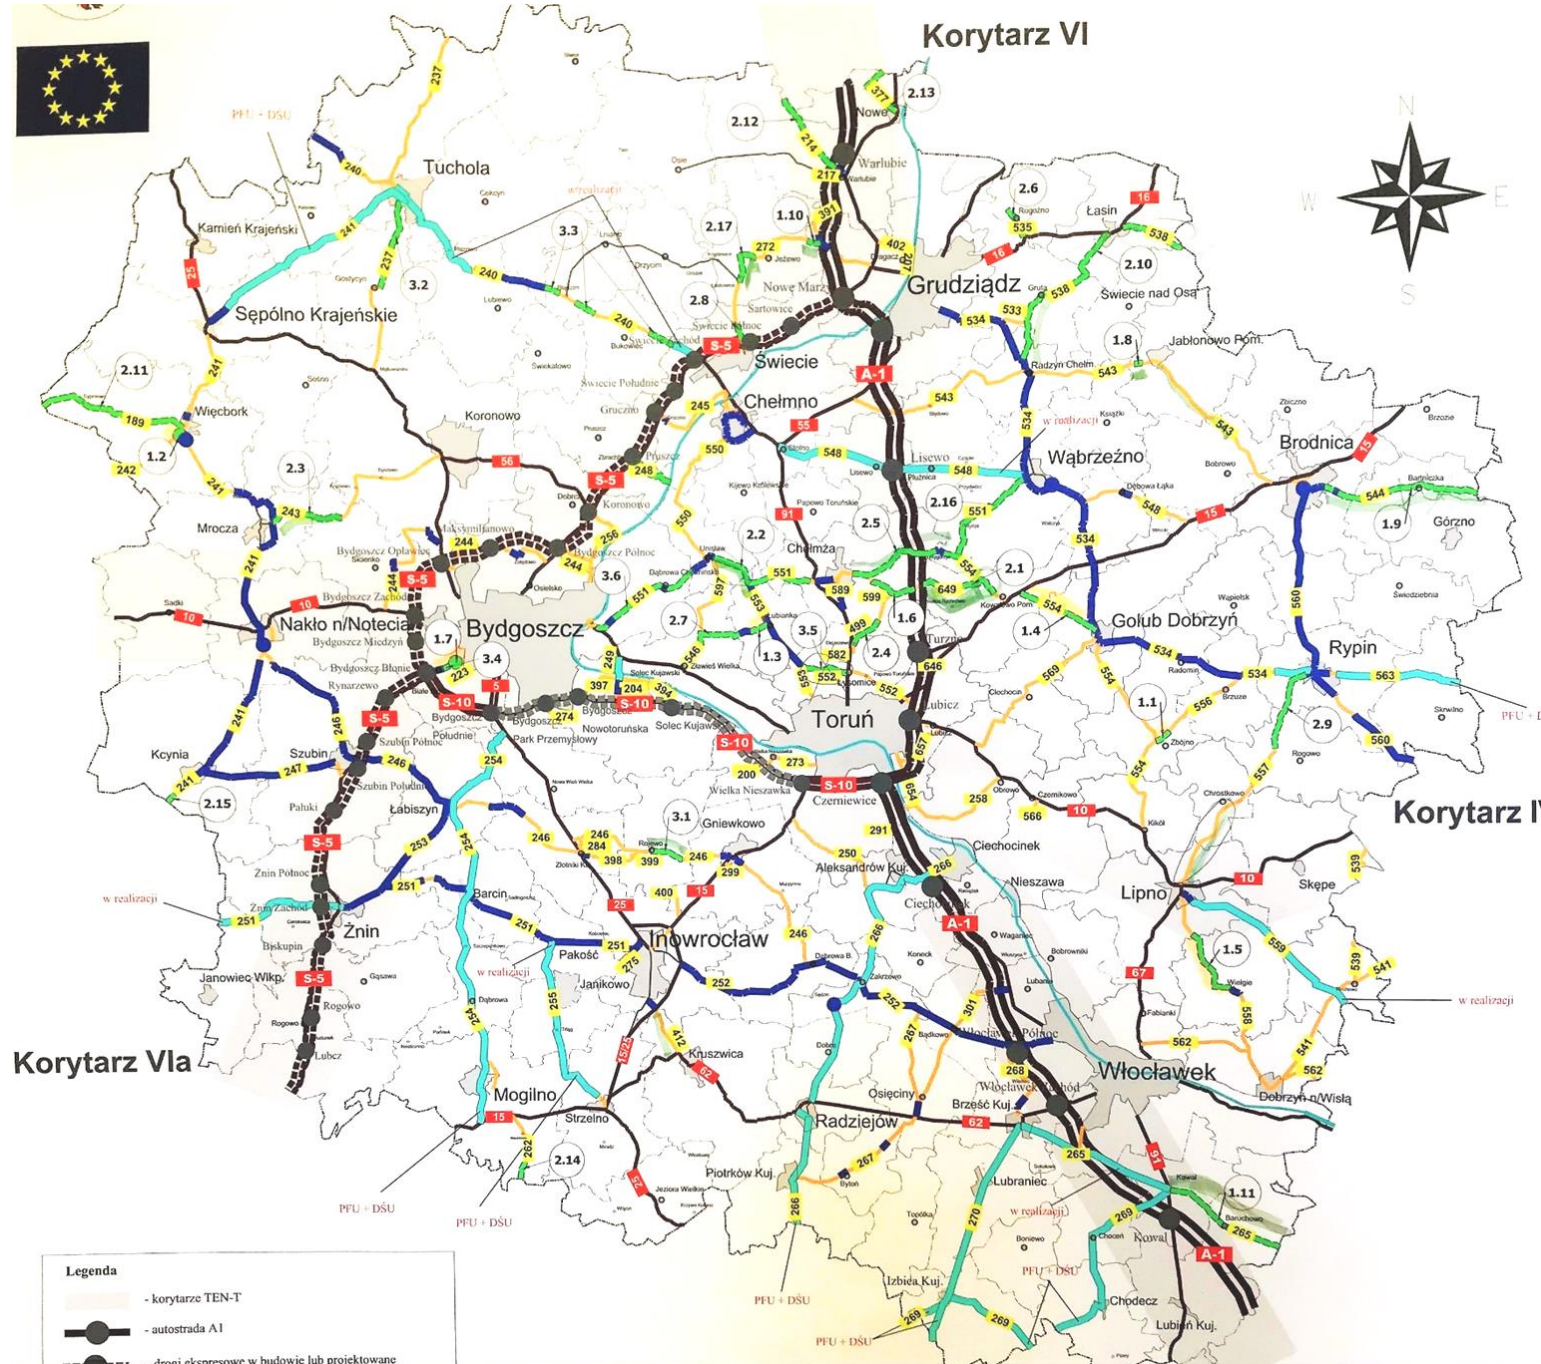

Legenda

- korytarze TEN-T
- autostrada A1
- drogi ekspresowe w budowie lub projektowane

PODPISANE UMOWY NA REALIZACJĘ

597 mln zł zabezpieczonych na modernizację wojewódzkich dróg

- Łączna długość dróg z podpisanymi umowami na realizację:
105,9 km
- Łączna wartość podpisanych umów z wykonawcami:
358,9 mln zł
- Łączna wartość zadań łącznie z kosztami dodatkowymi (wykupy gruntów, nadzory, promocja itp.):
389,6 mln zł



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

PODPISANE UMOWY NA REALIZACJĘ



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

- **DW 251** – umowa z dn. 26.01.2017 r.
Wykonawca: EUROVIA POLSKA S.A.
Wartość umowy: 46 887 658,01 brutto.
- **DW 559** – umowa z dn. 15.03.2017 r.
Wykonawca: EUROVIA POLSKA S.A.
Wartość umowy: 58 851 162,60 zł brutto.
- **DW 548** – umowa z dn. 19.04.2017 r.
Wykonawca (lider konsorcjum): Trakcja PRKiL S.A.
Wartość umowy: 83 796 445,61 zł brutto.
- **DW 265** - umowa z dn. 26.04.2017 r.
Wykonawca: EUROVIA POLSKA S.A.
Wartość umowy: 62 802 093,53 zł brutto.
- **DW 240** – umowa z dn. 03.08.2017 r.
Wykonawca: SKANSKA S.A.
Wartość umowy: 71 993 115,20 zł brutto.
- **DW 249 (PROM)**
 - **Droga** – umowa z dn. 10.05.2018 r.
Wykonawca (lider konsorcjum): GOTOWSKI Sp. z o.o.
Wartość umowy: 12 800 000,00 zł brutto.
 - **Prom** umowa z dn. 10.05.2018 r.
Wykonawca: Techno Marine Sp. z o.o.
Wartość umowy: 5 904 000,00 zł brutto.
- **DW 255 (I ETAP)** – umowa z dn. 12.06.2018 r.
Wykonawca: PBDiM KOBYLARNIA S.A.
Wartość umowy: 15 898 331,54 zł brutto.

Realizacja zadań drogowych współfinansowanych z RPO 2014 - 2020

	240	249	251	255	265	548	559
data zak zadania - pierwotna	8/2018	5/2019	6/2018	10/2018	6/2018	6/2019	6/2018
wskaźnik km dróg - planowany	16,468	2,580	14,790	2,215	18,160	28,610	22,093
oddano do użytku - WINB	8,000	0,000	7,440	0	0	0	4,853

Najważniejsze wyzwania na etapie wykonywania prac

Niezależne od wykonawców:

- Dodatkowe prace przy wymianie gruntu
- Zmiany wprowadzane na wniosek inwestora i mieszkańców (zjazdy, poprawa odwodnienia, melioracje)
- Konieczność uzyskania nowych warunków od gestorów sieci (projekty kilkuletnie).
- Występowanie w terenie niezainwentaryzowanej infrastruktury.
- Duża suma opadów jesienią (wrzesień 2017 – 125 mm, poprzednie lata 44 mm; październik 2017 – 102 mm, poprzednie lata 36 mm).
- Wysoki poziom wód gruntowych (wzrost nawet o kilka metrów).



Najważniejsze wyzwania na etapie wykonywania prac

Po stronie wykonawców:

- Znaczący wzrost cen materiałów budowlanych
(asfalt: 2017 – 1.300 zł/t, 2018 – 1.500 zł/t,
kruszywo: 2017 - 32,5 zł/t, 2018 – 60 zł/t,
robocizna: wzrost o 40% w porównaniu do 2016/17 r.
usługi: wzrost o 40% w porównaniu do 2016/17 r.
transport: wzrost o 25% w porównaniu do 2016/17 r.)
- Rotacja pracowników.
- Ścisły nadzór inwestorski.
- Czasochłonne uzgodnienia z gestorami sieci i innymi zarządcami dróg



Utrudnienia w procesie inwestycyjnym:

- Wydłużanie terminów realizacji zadań budowlanych i projektowych.
- Roszczenia wykonawców dotyczące robót dodatkowych wykraczające znacznie poza środki przeznaczone na realizację zadań.
- Oferty wykonawców w nowych przetargach znacznie przekraczające wartości kosztorysowe.
- Konieczność powtarzania postępowań przetargowych i zwiększanie środków na zamówienia.
- Konieczność dodatkowych aktualizacji dokumentacji projektowych.
- Zatory płatnicze pomiędzy wykonawcami i podwykonawcami.

ZADANIA PRZYGOTOWYWANE DO URUCHOMIENIA

- Wszystkie zadania z I grupy są uruchomione
- W bieżącym roku planowane jest zakończenie prac przy programach funkcjonalno-użytkowych dla zadań, które uruchomione zostaną w formule „zaprojektuj i wybuduj”:
 1. DW nr 241 Sępólno Kraj. Tuchola
 2. DW nr 254 Brzoza-Mogilno
 3. DW nr 255 Pakość-Strzelno (II etap)
 4. DW nr 266 Ciechocinek – Piotrków Kuj.
 5. DW nr 269 Kowal-Izbica Kuj
 6. DW nr 270 Brześć Kuj. – Izbica Kuj. (wraz z obwodnicą Lubrańca)
 7. DW nr 534 Cetki -Rypin
 8. DW nr 563 Rypin – granica województwa

INWESTYCJE REALIZOWANE W RAMACH 3 GRUPY

Zadania znajdujące się w grupie 3 Planu spójności.

- Finansowanie inne niż RPO WK-P źródło finansowania (m.in. obligacje), środki własne, kujawsko-pomorski fundusz pożyczkowo-leasingowo-kapitałowy.
- Zakres zadań: remontowo-inwestycyjne.
- Szacunkowy koszt realizacji – ok. 1-2,0 mln zł/1km.

Dokumenty zatwierdzające wykaz przedsięwzięć w ramach grupy 3 Planu Spójności.

- Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu dokumentacji projektowych dla dróg wojewódzkich w ramach realizacji III grupy Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020.
- Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia „Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014 -2020 – etap I”

INWESTYCJE REALIZOWANE W RAMACH 3 GRUPY



KUJAWY
POMORZE

Zakres zadań z 3 grupy Planu Spójności

- realizacja podstawowego zakresu w granicach istniejącego pasa drogowego,
- nośność nawierzchni 100 kN/oś,
- szerokość jezdni min. 6,0 m,
- frezowanie nawierzchni, profilowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie warstwy wiążącej, ścieralnej,
- odwodnienie nawierzchni, regulacja urządzeń obcych,
- remont istniejących zatok autobusowych przy przystankach oraz ewentualna budowa nowych,
- przebudowa zjazdów wraz z przebudową przepustów pod zjazdami,
- remont istniejących ciągów pieszych i rowerowych,
- przebudowa skrzyżowań z innymi drogami,
- elementy BRD (wg potrzeb), realizacja elementów uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych,
- oznakowanie poziome i pionowe,
- prace branżowe,
- wycinka drzew kolidujących z inwestycją.

INWESTYCJE REALIZOWANE W RAMACH 3 GRUPY

INWESTYCJE Zrealizowane

Nr drogi	Nazwa odcinka	Długość [km]	Wartość zadania
556	m. Zbójno	2,1	10,1 mln
241/ 242	Więcbork - rondo	0,3	1,9 mln zł
Razem inwestycje zrealizowane		2,4km	12,0 mln zł



KUJAWY
POMORZE

INWESTYCJE REALIZOWANE W RAMACH 3 GRUPY

KUJAWY
POMORZE

INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI

Nr drogi	Nazwa odcinka	Długość [km]	Wartość zadania
546	Bierzgłowo - Łubianka	2,311	12,9 mln zł
554	Kowalewo Pomorskie - Golub Dobrzyń	9,650	15,6 mln zł
558	Kłokock - Wielgie	7,709	13,4 mln zł
223	Białe Błota „rondo Miedzyń” (przetarg)	0,700	18,6 mln zł
Razem inwestycje w trakcie realizacji		20,37km	60,5 mln zł

INWESTYCJE REALIZOWANE W RAMACH 3 GRUPY



KUJAWY
POMORZE

INWESTYCJE – planowane do realizacji – lista podstawowa

Nr drogi	Nazwa odcinka	Długość [km]	Szacunkowe wartości zadania
649	Pluskowęsy – Sierakowo	5,6	6,1 mln
543	Jabłonowo Pom. - Czekanowo	11,9	9,8 mln zł
544	Brodnica – Łaszewo	11,0	10,0 mln zł
272	Piła Młyn Dolna Grupa	2,0	2,8 mln zł
265	Kowal - granica województwa	14,9	15,5 mln zł
557	Chrostkowo-Lipno	16,2	15,0 mln zł
551	Unisław-Wybcz	5,0	4,8 mln zł

INWESTYCJE REALIZOWANE W RAMACH 3 GRUPY



KUJAWY
POMORZE

INWESTYCJE – planowane do realizacji – lista podstawowa

Nr drogi	Nazwa odcinka	Długość [km]	Szacunkowe wartości zadania
246	Rojewo-Płonkowo	4,1	3,9 mln
649/554	Kiełbasin-Kowalewo Pom.	9,8	9,7 mln zł
243	Mrocza - Prosperowo	9,7	9,6 mln zł
499	Ostaszewo-Sławkowo	3,8	4,0 mln zł
551	Chełmża-Orzechowo	14,3	14,4 mln zł
538	Radzyń - Gruta	8,6	8,7 mln zł
412	Janowice	0,8	1,0 mln zł
237	Gostycyn-Mąkowsko	10	9,8 mln zł

INWESTYCJE REALIZOWANE W RAMACH 3 GRUPY



KUJAWY
POMORZE

INWESTYCJE – planowane do realizacji – lista podstawowa

Długość: 128 km

Szacowany koszt: 125 mln zł

**Zaawansowanie: zadania z
dokumentacją, przygotowywanie
finansowania**

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA REMONTOWE W 2019 – uzupełnienie 3 grupy

- DW nr 240 – remonty ul. Nowodworskiego, Głównej, Chojnickiej
- DW nr 557 - przebudowa ul. Lipnowskiej w Rypinie wraz z budową sygnalizacji
- DW nr 569 – przebudowa skrzyżowania z DW 554, ul. Zamkowa w m. Golub Dobrzyń
- DW nr 552 – przebudowa drogi m. Lulkowo
- DW nr 562 – przebudowa drogi w Dobrzyniu nad Wisłą
- Powierzchniowe utrwalenia nawierzchni
 - 6 odcinków dróg
 - długość 11,228 km
 - koszt 2,1 mln zł
- Przebudowa 3 przepustów

Struktura sieci drogowej w województwie

Krajowe	Wojewódzkie	Powiatowe	Gminne
1207	1781	6670	8685

		Gminy		Powiaty		Województwo	
Rok	Źródło finansowania	Ilość projektów (zadań)	Ilość zmodernizowanych km dróg	Ilość projektów (zadań)	Ilość zmodernizowanych km dróg	Ilość projektów (zadań)	Ilość zmodernizowanych km dróg
2014 - 2018	RPO	16	3,170	12	19,140	10	107,920
2014 - 2018	PROW	150	179,210	17	32,180	0	0,000
2014 - 2018	tzw. FOGR	524	358,646				
2014 - 2018	w dysp. wojew.					206	142,140
Razem		690	541,026	29	51,320	216	250,060
			8.685		6.670		1.690

Dziękuję za uwagę

Mirosław Graczyk – Departament Infrastruktury i Transportu

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
